Trabajo Práctico N° 2 – U.4

Entrega 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno: Botta, Julio Rafael

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

López, Mario Raúl

Docente Tutor

Martínez, Eduardo Daniel

3 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas

1. **<u>Análisis FODA del Proyecto:</u>** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. **<u>Objetivos y Metas:</u>** redactar el objetivo del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativos que deba cumplir el sistema (ej. Tiempos de respuestas, escalabilidad de registros o plazos temporales).


3. **<u>Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):</u>** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

1) Análisis FODA del Proyecto

Empresa/Organización: H-21 (TENTO SRL)
https://www.h21.com.ar/

Continuando con lo expuesto sobre la empresa en el práctico anterior, realizando un análisis del proyecto y de la empresa, la realización del proyecto es sumamente viable, principalmente al ser algo a medida para una pyme el desarrollo puede pactarse por etapas, crea un ahorro en dólares con comparación con sistemas de gestión conocidos en el mercado y además se asegura que el código fuente quede en manos de la empresa.
Teniendo en cuenta lo anterior, cómo equipo de desarrollo, se llega a desarrollar la siguiente matriz FODA, con los diferentes factores positivos y negativos, para su desarrollo:

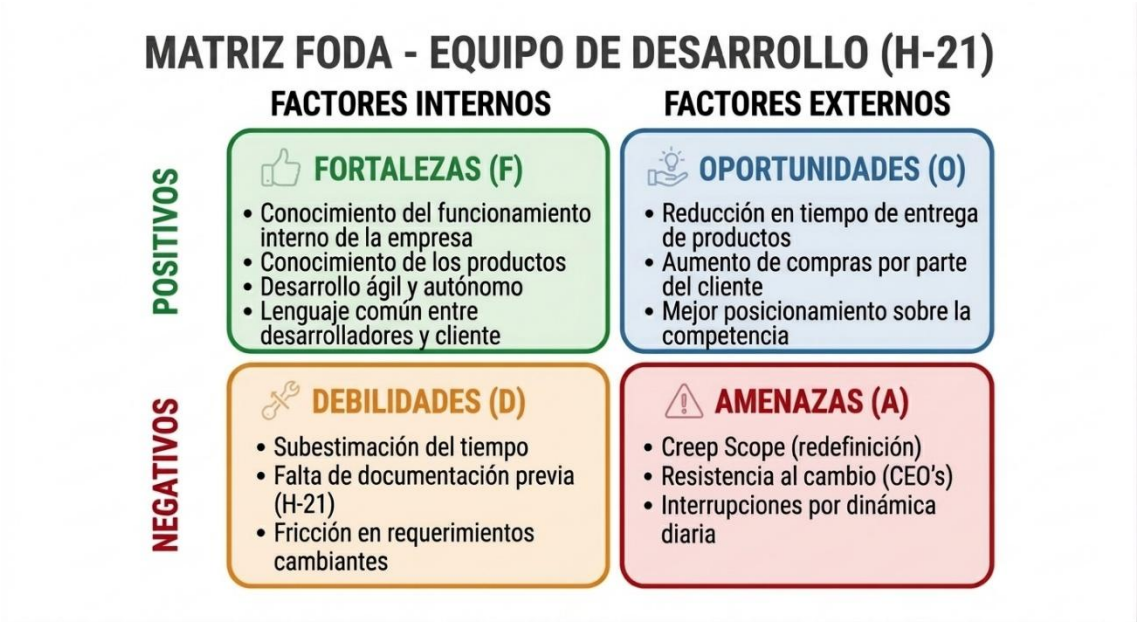

2) Objetivos y Metas

Objetivos

Teniendo en cuenta cómo se dijo antes, que el sistema de gestión interno va a ser para una pyme con una estructura pequeña y básica, se pueden distinguir 3 objetivos bastantes claros, y a criterio, los más importantes:

- **Unificar y estandarizar la gestión operativa:** Unificar la comunicación y el flujo de trabajo entre los CEO's, la supervisión técnica, la contabilidad y la administración en una sola plataforma, eliminando planillas paralelas e información aislada.
- **Desplegar un MVP:** Lanzar una primera versión del software centrada en el CRUD esencial de órdenes de producción y registros clave, evitando demoras causadas por adiciones de alcance no planificadas.
- **Asegurar una tasa de adopción del 100% en los roles clave:** Garantizar que los 4 perfiles definidos (CEO's, Supervisor, Contador, Administrativo) incorporen la herramienta en su rutina diaria sin interrumpir la dinámica de la planta.

Metas Medibles (Kpi's)


Para evaluar si el desarrollo del proyecto avanza según lo planificado, se proponen las siguientes metas:

- Desarrollo y Calidad (Corto plazo):
    - Definición de alcance (2 semanas): relevar y congelar todos los campos y reglas del negocio para los 4 roles antes de empezar a escribir código.
    - Entregables funcionales: Completar el desarrollo de los módulos centrales en un plazo máximo de 8 semanas.
    - Control de modificaciones: mantener un margen pequeño a solicitudes de cambios durante el desarrollo.
- Implementación y Adopción (Mediano a Largo plazo):
    - Carga inicial de datos: previo a la semana de despliego, migrar y validar todos los catálogos actuales (productos, proveedores, personal, etc.)
    - Capacitación efectiva: Lograr que los 4 roles realicen pruebas de aceptación de sus flujos con una efectividad absoluta antes de salir a producción.
    - Transición y abandono de herramientas antiguas: reemplazar por completo planillas manuales o informales en un plazo de 15 días después del despliegue.

3) Planificación Temporal (GANTT)

La propuesta del software de gestión interna para la empresa se concentra en los siguientes puntos fundamentales, a partir de los cuales se puede escalar a medida del crecimiento económico de la misma, al ser un desarrollo modular:

- Asistencia de personal (se puede sincronizar con el ingreso con huella instalado en planta), entrega de materiales EPS, alta en la empresa y alta en la ART, cálculo de jornales.
- Control de stock de materias primas con una alerta de pedido de acuerdo con la fabricación planificada
- Control de stock de productos: columnas, crucetas, dados, bielas, etc.
- Control de facturación: órdenes de compra facturadas y no facturadas.
- Control de entregas: órdenes no entregadas, órdenes entregadas parcialmente y órdenes entregadas.

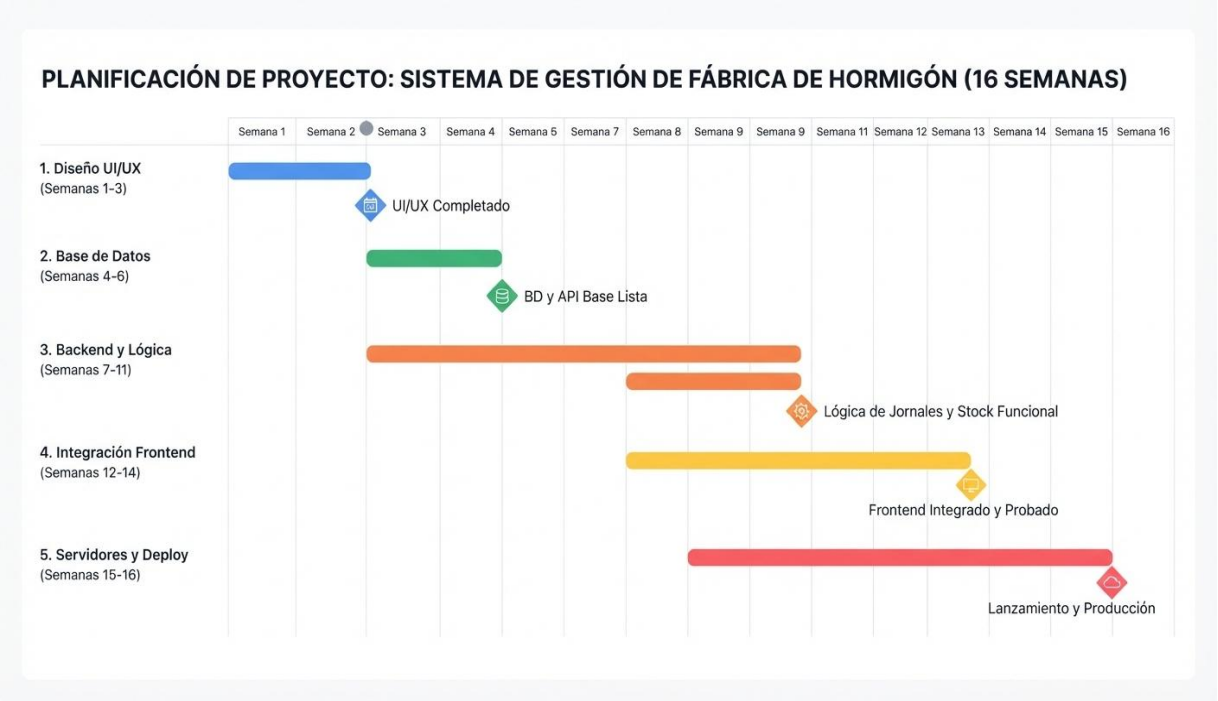

Nota: La imagen de la matriz FODA está generada a través de Gemini, usando los puntos de cada cuadrante. Así también utilizando la metodología RCI (rol, contexto, instrucción) se realizó el cálculo estimativo de los tiempos de desarrollo del software, perfeccionando y cambiando de manera eficiente puntos clave para el desarrollo del GANTT, cómo así también la imagen del diagrama de GANTT.
